



1次切替施工プロセス

2010/7/12作成


7月5日 路面切替・中間層 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月5日施工済み

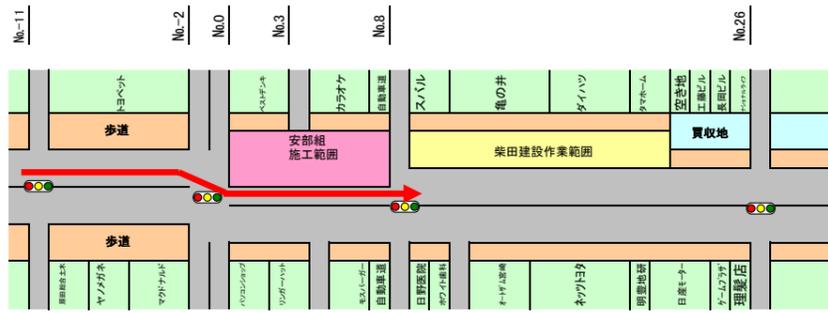


7月13日 6:00~ 切替後7月21日6:00切替予定

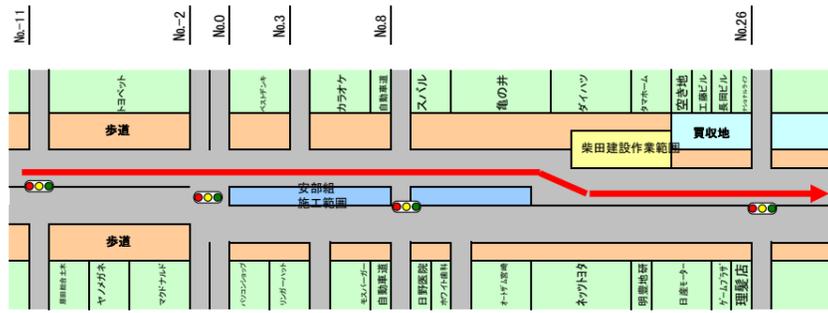


7月20日 路面切替・中間層・仮区画線→切替(上り線) 上り線1車線規制(21:00~6:00)7月30日施工予定

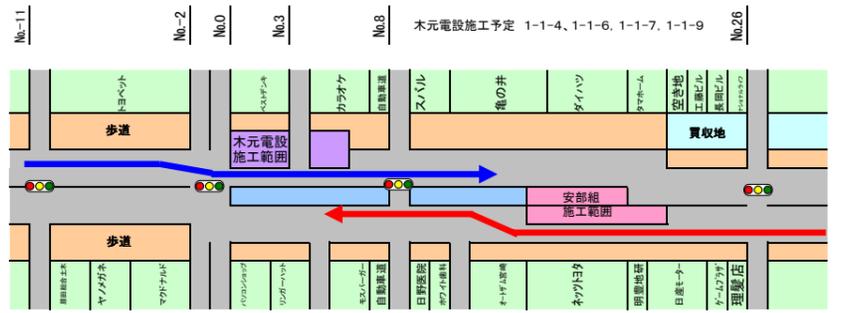


7月6日 路面切替・中間層 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月6日施工済み

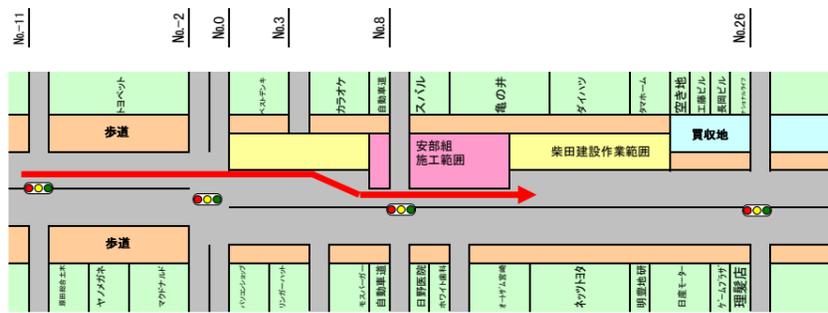

7月13日 路面切替・中間層(仮ペイントにて車線切替) 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月21日施工予定

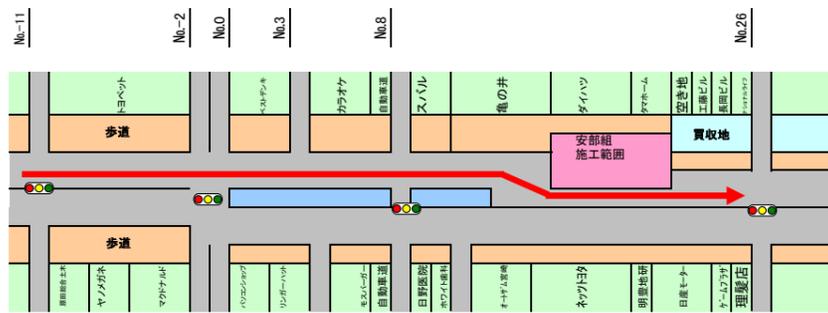

7月21日 路面切替・中間層・仮区画線→切替(上り線) 上り線1車線規制(21:00~6:00)8月2日施工予定

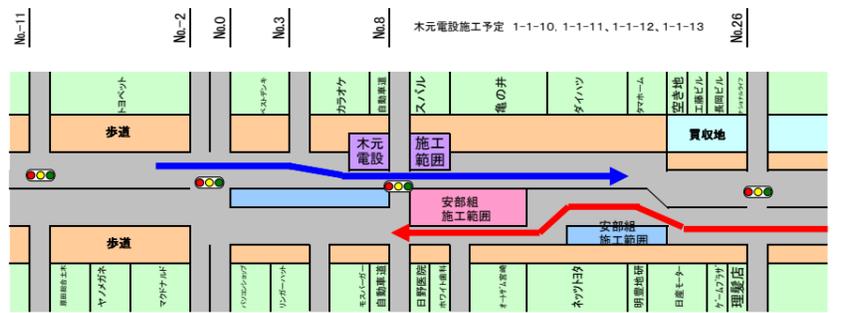

7月7日 路面切替・中間層(仮ペイントにて車線切替) 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月7日施工済み



7月14日 6:00~ 切替後7月21日施工予定7月22日6:00切替予定




7月22日 路面切替・中間層・仮区画線→切替(上り線) 上り線1車線規制(21:00~6:00)8月3日施工予定



7月8日 表層 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月9日施工済み




7月14日 6:00~ 切替後7月21日施工予定7月22日6:00切替予定

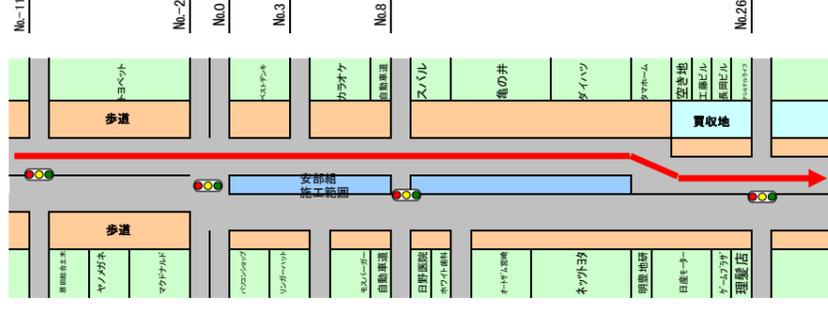


7月23日 路面切替・中間層・仮区画線→切替(上り線) 上り線1車線規制(21:00~6:00)8月4日施工予定




7月8日 6:00~ 切替後7月10日 6:00~

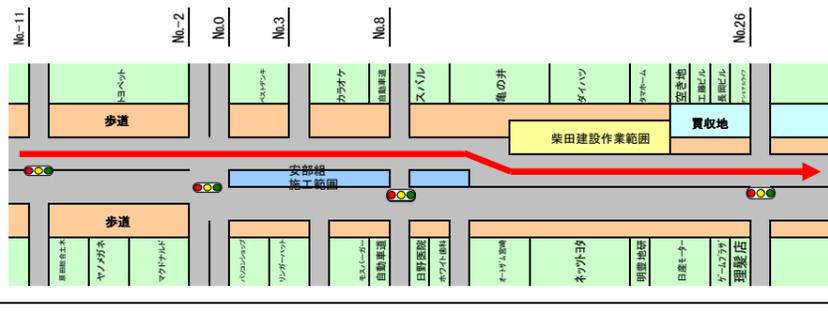


7月14・15日 表層 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月23・26日施工予定

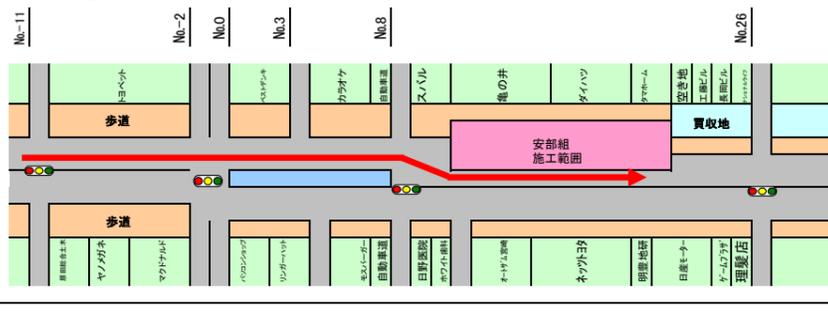


7月24日 上り線切替完了8月5日上り線切替完了予定

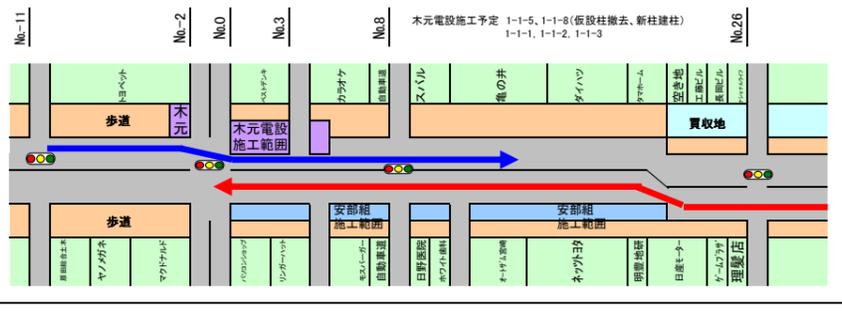

7月12日 路面切替・中間層(仮ペイントにて車線切替) 下り線1車線規制(21:00~6:00)7月20日施工予定

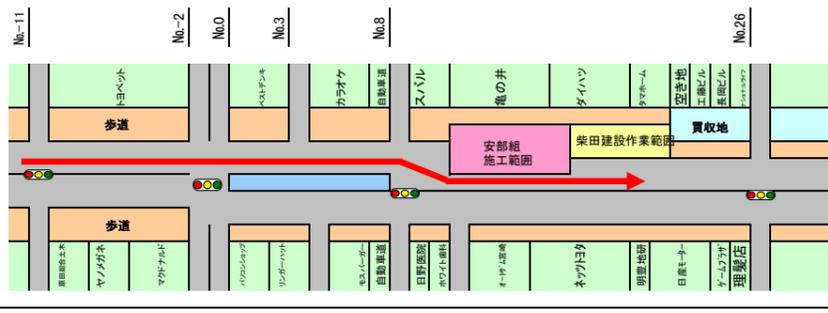

7月17日 下り線切替完了7月29日下り線切替完了予定

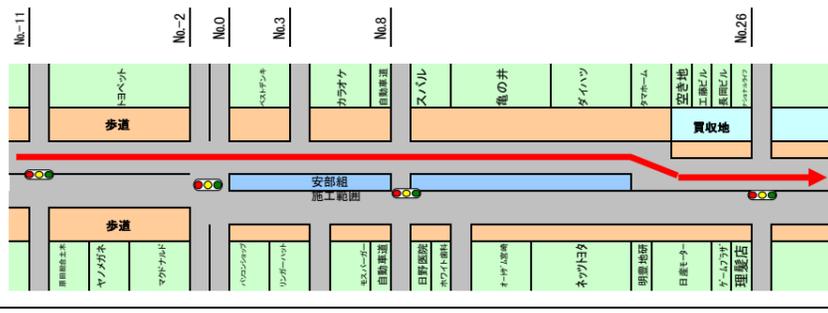

1次切替後、府内大橋南交差点~宮崎交差点の切替実施

